

Uitvoeringsprogramma



BRUINISSE
voortvarend

2019-2022

Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 september 2019

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Organisatiestructuur	6
3. Overzicht lopende projecten	7
4. Schema planning lopende projecten periode 2019-2022	9
5. Overzicht afgeronde projecten	15

1. Inleiding

De gemeenteraad heeft op 18 december 2014 het tweede Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend 2015-2018 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is een belangrijk instrument voor de uitvoering van het Programmaplan Bruinisse Voortvarend, dat in 2007 is vastgesteld. Jaarlijks is uw raad via de voortgangsrapportage Bruinisse Voortvarend geïnformeerd over de stand van zaken. Voor u ligt de derde geactualiseerde versie van het Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend en heeft betrekking op de jaren 2019 tot en met 2022.

De economie is in de voorgaande periode opgeklommen uit de crisis. Marktpartijen hebben in de afgelopen periode meer kansen gezien om plannen verder te kunnen uitwerken. In een aantal gevallen heeft dat ook geresulteerd in afspraken over uitvoering voor plannen in het centrumgebied en tot daadwerkelijke realisatie daarvan. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van het doel om Bruinisse weer een dorpshart te geven. Daarentegen is een aantal ontwikkelingen in het centrum waarvan woningbouw onderdeel is, in 2017 'on hold' gezet vanwege de nieuwe Woonvisie 2018-2027 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Aanvullende besluiten zijn nodig om weer ruimte te kunnen creëren voor woningbouw in Bruinisse. De prioriteit ligt bij de echte centrumlocaties en in kleinere hoeveelheden, tot maximaal 11 woningen, waarbij een belangrijk aandachtspunt is dat kwalitatief de juiste woningen worden toegevoegd.

Het afgelopen jaar zien we dat door de grotere vraag dan het aanbod in de bouwwereld de bouwkosten sterk stijgen. Het risico is dat dat de haalbaarheid van diverse ontwikkelingen weer onder druk zet. Daar komt ook bij dat de wetswijziging die betrekking heeft op gasloos bouwen vraagt om een omslag in denken en zoeken naar de beste oplossing voor de betreffende ontwikkeling om invulling te geven aan de opgave van de energietransitie. De langere looptijd van diverse ontwikkelingen is voor de kwaliteit van de leefomgeving minder gewenst. Het voordeel daarvan blijkt nu wel zichtbaar. Door de landelijke politieke aandacht en bijbehorende besluitvorming over het klimaat en de energietransitie zal Bruinisse in de aankomende jaren in het centrum gebouwen zien verrijzen die voldoen aan de nieuwe energie-eisen. De toekomstige eigenaren en gebruikers van die gebouwen hebben daarmee een voorsprong op de eigenaren en gebruikers van overige bestaande bebouwing in het dorp.

U ziet in deze versie van het Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend het doorschuiven van een aantal projecten vanwege bovenstaande ontwikkelingen. In deze versie van het Uitvoeringsprogramma Bruinisse Voortvarend is het overzicht van de afgeronde projecten aangevuld, inclusief vermelding van de werkelijke kosten c.q. de werkelijke investering. Projecten worden in dat overzicht opgenomen, op het moment dat sprake is van een geëvalueerd project en de financiële verantwoording heeft plaatsgehad. Uiteindelijk geeft dat inzicht in de investeringen die in Bruinisse zijn gedaan voor de realisatie van de centrale doelstelling uit het Programmaplan Bruinisse Voortvarend.

1.1 Doelen

De doelen die in het Programmaplan Bruinisse Voortvarend zijn opgenomen geven we hier in het kort nog even weer. Van belang is dat alle projecten uiteindelijk een bijdrage leveren aan de centrale doelstelling voor Bruinisse: "een duurzame ontwikkeling naar een leefbaar dorp Bruinisse, waar het prettig wonen, werken en recreëren is en waarbij de relatie met het omliggende water is hersteld".

Subdoelstellingen

De subdoelstellingen hebben betrekking op de zogenaamde ER-doelen, dat wil zeggen groter beter of meer van hetgeen er al is, of eventueel minder. Dit zijn na te streven doelen en zijn richtinggevend voor de uiteindelijke resultaten van de projecten. De projecten uit het uitvoeringsprogramma moeten een bijdrage leveren aan één of meerdere subdoelen.

Voor Bruinisse zijn de volgende doelen als onderdeel van de centrale doelstelling vastgesteld:

1. Vitaler centrum
2. Gedifferentieerder woningaanbod
3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister
4. Betere sportvoorzieningen
5. Meer leefbaarheid
6. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte
7. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid
8. Betere economische structuur

1.2 Opzet

Het uitvoeringsprogramma is dynamisch van opzet. Dit betekent dat projecten niet haalbaar blijken te zijn, of dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat het beter is om te kiezen voor een wijziging in aanvankelijke uitgangspunten of projecten. Zo is in de afgelopen periode de Visie Vluchthaven wel opgesteld, maar niet vastgesteld. Nader verkeersonderzoek in het kader van het inrichtingsplan openbare ruimte in 2011 heeft uitgewezen dat toch beter niet kan worden gekozen voor invoering van eenrichtingverkeer in de Burgemeester Hagelaan.

Vanzelfsprekend kunnen er gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma ook nieuwe projecten aan worden toegevoegd. Voorbeelden daarvan zijn het opknappen van het viaduct De Meestove en de wandelroute Bru Verbeeld. Daarover is dan ook gerapporteerd in de jaarlijkse voortgangsrapportages.

De lijst met projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, zijn projecten die al lopen, dan wel waarmee in de looptijd van het uitvoeringsprogramma wordt gestart, of waarvoor te zijner tijd voorstellen zullen worden gedaan om ermee te gaan starten. Het is uiteraard mogelijk dat de doorlooptijd van projecten langer is dan de overzichtsperiode van deze versie van het uitvoeringsprogramma. Belangrijk aandachtspunt is dat in diverse projecten sprake is van een onderlinge afhankelijkheid. In de bijlage bij dit uitvoeringsprogramma zijn onderlinge afhankelijkheden ook zichtbaar gemaakt. Het betreft vooral de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte op diverse locaties in het centrumgebied. De gemeente kan de uitvoering daarvan pas oppakken, als de bouwactiviteiten voor de diverse herontwikkelingslocaties gereed zijn. Als de planning van de uitvoering van die locaties wijzigt, dan heeft dat direct gevolgen voor het moment waarop de gemeente haar deelprojecten kan gaan uitvoeren.

Om alle ambities uit het Programma Bruinisse Voortvarend te kunnen realiseren is uiteraard sprake van een langere looptijd. Zodra projecten dus concreet worden, zullen ze in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen. Potentiële herontwikkelingslocaties vindt uw raad derhalve niet terug. Daarmee kan de Stuurgroep Bruinisse op dit moment nog niets doen, de projecten zijn nog niet concreet en daarmee niet rijp om in een uitvoeringsprogramma op te nemen. De volgorde van uitvoering wordt bepaald door de Stuurgroep Bruinisse. Die heeft een belangrijke rol in de uiteindelijke realisatie van de plannen. De Stuurgroep Bruinisse bespreekt initiatieven voor projecten en bepaalt in welke mate het initiatief kan bijdragen aan bepaalde vastgestelde na te streven doelen, om het uiteindelijk een plaats te geven in het uitvoeringsprogramma. Vervolgens worden ook voorstellen gedaan om de projecten vanuit de gemeente te kunnen begeleiden (regierol). Als de gemeente initiatiefnemer is, dan worden voorstellen gedaan over uitvoering van projecten met de daarbij benodigde randvoorwaarden en middelen. De stuurgroep doet daarover voorstellen aan ons college en indien nodig doen wij daarover voorstellen aan uw raad. De volgorde van uitvoering kan mee worden geschoven


als sprake is van een onderlinge afhankelijkheid van verschillende projecten ten opzichte van elkaar.

Met de vaststelling van de Structuurvisie Bruinisse 2025 is het gewenste eindbeeld voorzien in het jaar 2025. Dat is tevens de voorziene einddatum van het Programma Bruinisse Voortvarend. Eind 2018 zijn we halverwege de looptijd van de Structuurvisie Bruinisse 2025 (vastgesteld in 2011). De tussentijdse evaluatie van het programma Bruinisse Voortvarend is gepresenteerd aan uw raad op 4 maart 2019.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van het uitvoeringsprogramma is schematisch de organisatiestructuur opgenomen, voor de toelichting wordt verwezen naar het Programmaplan Bruinisse Voortvarend. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht welke projecten worden uitgevoerd, of waarmee in de aankomende jaren een start zal worden gemaakt. In hoofdstuk 4 treft u een schema aan met de planning. In hoofdstuk 5 is zoals gezegd een overzicht opgenomen van afgeronde projecten, met inzicht in de werkelijke kosten c.q. de werkelijke investeringen. Wij beschikken niet in alle projecten van derden over de werkelijke investeringskosten, om die reden treft u in dat overzicht nog een aantal p.m. posten aan. De nummering van de projecten per subdoel is gelijk aan de eerste versie van het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat bij opname van nieuwe projecten, de nummering doorloopt.

2. Organisatiestructuur

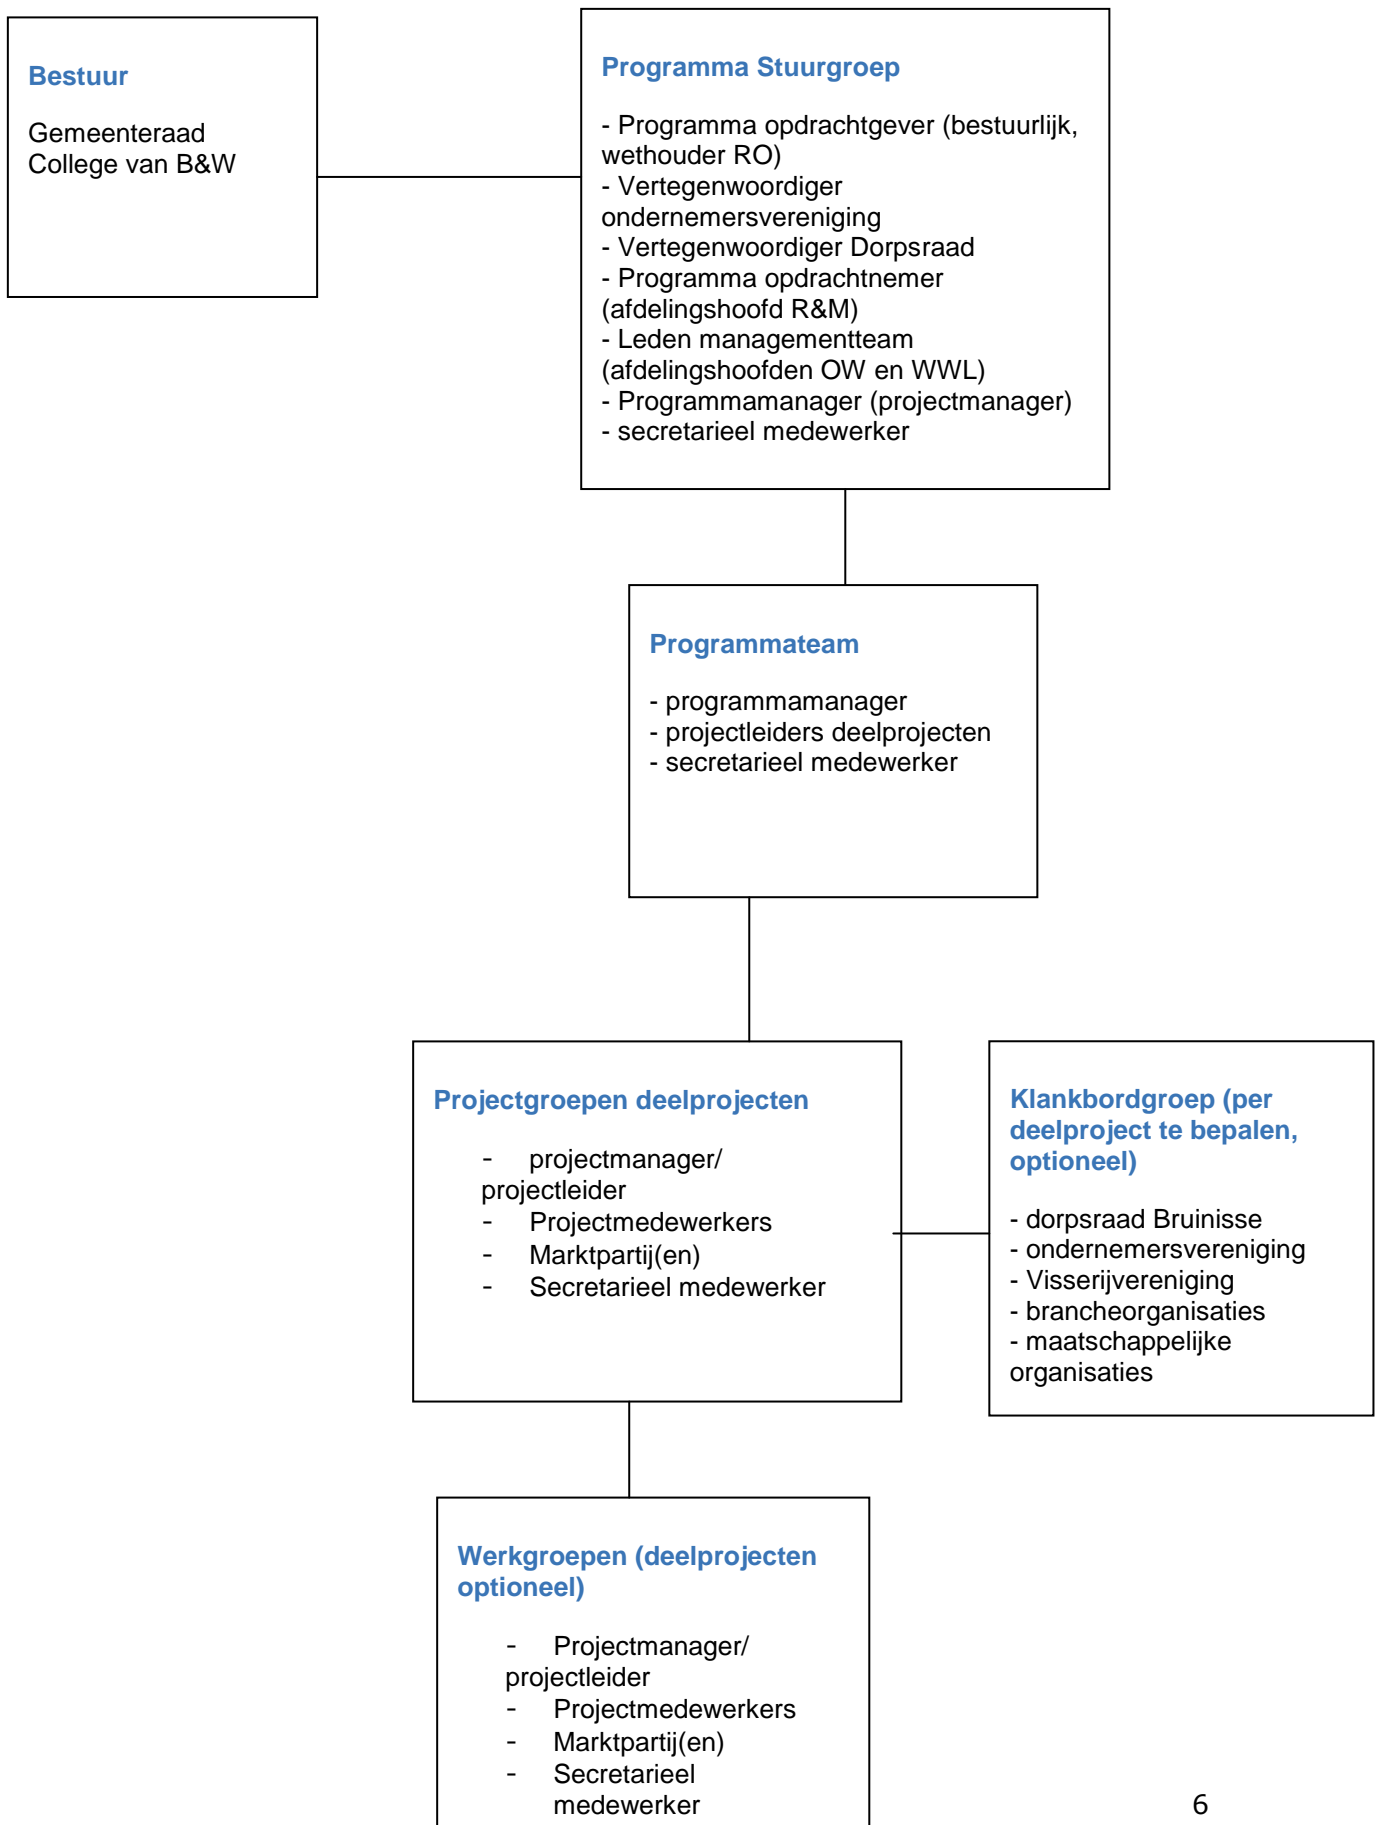

3. Overzicht lopende projecten

In onderstaand overzicht is per na te streven subdoelen uit het Programmaplan Bruinisse Voortvarend weergegeven welke projecten daaraan in belangrijkste mate een bijdrage leveren. Projecten bevinden zich in verschillende fasen. Voor zover kostenramingen niet bekend of nog niet bekend zijn, is voorzien van de aanduiding p.m. Gaandeweg de verdere ontwikkeling van het project en uitvoering komt dat in beeld en wordt ontbrekende informatie aangevuld. Voor zover het gemeentelijke beleidsvisies zijn die in het kader van het programma worden opgesteld, is uitsluitend sprake van interne kosten, weergegeven als apparaatskosten. De projecten in het uitvoeringsprogramma zijn niet louter ruimtelijke projecten, al komen die in aantallen wel het meeste voor. Diverse projecten bestaan uit deelprojecten. Voor zover een deelproject in belangrijkste mate een bijdrage levert aan een ander subdoel, is het deelproject geplaatst onder het betreffende subdoel.

ER-doelen	Projecten	Raming kosten	Initiatiefnemer(s)
1. Vitaler centrum			
1.2	Herontwikkeling Kop Nieuwstraat	€ p.m.	Ontwikkelingsmaatschappij Bijdorp
1.3	Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	€ p.m.	MG Vastgoed B.V.
1.4	Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat	€ p.m.	Real Estate Bruinisse B.V.
2. Gedifferentieerder woningaanbod			
2.1	Herstructurering woningen Koningin Julianastraat en omgeving	Fase 3 € p.m.	Zeeuwend
2.5	Herstructurering woningen Noordstraat	€ p.m.	Zeeuwend
2.6	Herstructurering woningen Deltastraat/Van Hertsbekestraat	€ p.m.	Zeeuwend
3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister			
3.8	Samenwerking ondernemers	€ p.m.	Ondernemersvereniging

5. Meer Leefbaarheid

5.3	Uitvoeringsacties Dorpsblik	€ p.m.	Dorpsraad en andere maatschappelijke organisaties
-----	-----------------------------	--------	---

6. Betere economische structuur

6.1	3 ^e fase Bedrijventerrein Bruinisse	Grex.	Gemeente
6.3	Branding Bruinisse, uitwerking visie en opstellen actieprogramma	€ p.m.	Ondernemersvereniging Bruinisse
6.6	Inrichting noordelijk deel Vluchthaven - aanleg water en elektra	€ 35.000	Gemeente

7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte

7.2	Herinrichting openbare ruimte Koningin Julianastraat e.o., fase 3	Is onderdeel project 2.1	Zeeuwend
7.6	Herinrichting openbare ruimte Dreef, inclusief aanhechting Molenstraat	€ 1.150.000. € 300.000	Gemeente Real Estrate Bruinisse B.V.
7.7	Herinrichting Kerkplein	€ 1.500.000	Gemeente
7.8	Rioolvervanging en herinrichting Nieuwstraat en deel Poststraat	€ p.m. + beheerplan riolering	Gemeente
7.9	Relinen riolering Lange Ring	Beheerplan riolering	Gemeente
7.12	Klimaat stresstest	€ p.m.	Gemeente

8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid

8.5	Herinrichting Deestraat	€ 530.000	Gemeente
8.8	Herinrichting Oudestraat	€ p.m.	Gemeente

4. Schema planning lopende projecten

In onderstaand schema is de planning in jaarschijven per project weergegeven, acties per jaar zijn daarin weergegeven.

Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
2019	1. Vitaler Centrum	1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat	Planvorming, Contractvorming, Vergunningtraject
		1.3 Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	Ideevorming Planvorming
		1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat	Planologisch traject Vergunningtraject fase 1
	2. Gedifferentieerder woningaanbod	2.1 Herstructurering woningen Koningin Julianastraat e.o.	start nieuwbouw fase 3
		2.3 Woningbouw Riekusweel IV	Evaluatie
		2.5 Herstructurering woningen Noordstraat	Planvoorbereiding Start uitvoering
		2.6 Herstructurering woningen Deltastraat/Van Hertsbekestraat fase 1	Planvoorbereiding Start sloop
	3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister	3.8 Samenwerking ondernemers (mogelijk samenhang met 6.3)	Ideevorming Planvorming
	5. Meer leefbaarheid	5.3 Uitvoeren acties Dorpsblik	Doorlopend
	6. Betere economische structuur	6.1 Bedrijventerrein fase 3	Gronduitgifte
		6.3 Branding Bruinisse	Uitwerken visie en opstellen actieprogramma
		6.6 Inrichting noordelijk deel Vluchthaven - aanleg water en elektra	Uitvoering

Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
2019	7. <i>Betere beeldkwaliteit openbare ruimte</i>	7.3 Aanleg park Riekusweel	Evaluatie (onderdeel 2.3)
		7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef, inclusief deel Molenstraat	Voorbereiding (implementatie uitkomsten project 7.12)
		7.7 Herinrichting Kerkplein	Planvoorbereiding
		7.12 Klimaat Stresstest - Rioolonderzoek - pilot herinrichting openbare ruimte Beatrixstraat/Wilhelminalaan (relatie met 2.1, fase 3) - dorpsdialoog	Uitvoering
	8. <i>Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid</i>	8.9 Onderzoek gebruik OV halte Deltastraat	Voorbereiding besluit financiering

Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
2020	1. Vitaler Centrum	1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat	Vorbereiding uitvoering Uitvoering
		1.3 Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	Contractvorming Planologisch traject
		1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat	Vorbereiding uitvoering Uitvoering fase 1 Oplevering fase 1 Vergunningtraject fase 2 Vorbereiding uitvoering fase 2 Start uitvoering fase 2
	2. Gedifferentieerder woningaanbod	2.1 Herstructurering woningen Koningin Julianastraat e.o.	Realisatie nieuwbouw fase 3 Oplevering Nazorg (openbare ruimte)
		2.3 Woningbouw Riekusweel IV	Evaluatie
		2.5 Herstructurering woningen Noordstraat	Realisatie nieuwbouw Oplevering
		2.6 Herstructurering woningen Deltastraat/Van Hertsbekestraat fase 1	Vorbereiding uitvoering Uitvoering
	3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister	3.8 Samenwerking ondernemers (mogelijk samenhang met 6.3)	Uitvoering
	5. Meer leefbaarheid	5.3 Uitvoeren acties Dorpsblik	Doorlopend
	6. Betere economische structuur	6.1 Bedrijventerrein fase 3	Gronduitgifte
		6.3 Branding Bruinisse	Uitvoering acties
	7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte	7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef, inclusief deel Molenstraat	(implementatie uitkomsten project 7.12) Uitvoering
		7.7 Herinrichting Kerkplein	Vorbereiding (implementatie uitkomsten project 7.12) Uitvoering
		7.8 Riolervervanging en herinrichting Nieuwstraat en deel Poststraat (in samenhang met 7.7)	Vorbereiding (implementatie uitkomsten project 7.12)
		7.9 Relinen riolering Lange Ring (in samenhang met 7.7)	Vorbereiding (Implementatie uitkomsten project 7.12) Uitvoering
		7.12 Klimaat Stresstest	Evaluatie en nazorg
	8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid	8.9 Onderzoek gebruik OV halte Deltastraat	Vorbereiding uitvoering Uitvoering

Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
2021	1. Vitaler Centrum	1.2 Herontwikkeling Kop Nieuwstraat	Oplevering Evaluatie en nazorg
		1.3 Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	Planologisch traject Vergunningentraject Sloop
		1.4 Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat	Uitvoering fase 2 Oplevering fase 2 Evaluatie en nazorg
	2. Gedifferentieerder woningaanbod	2.6 Herstructurering woningen Deltastraat/Van Hertsbekestraat fase 1	Oplevering Evaluatie en nazorg
		Fase 2	Planvoorbereiding
	3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister	3.8 Samenwerking ondernemers (mogelijk samenhang met 6.3)	Uitvoering
	5. Meer leefbaarheid	5.3 Uitvoeren acties Dorpsblik	Doorlopend
		5.4 Verhuizing bibliotheek	Uitvoering (samenhang met 1.2)
	6. Betere economische structuur	6.1 Bedrijventerrein fase 3	Gronduitgifte
		6.3 Branding Bruinisse	Uitvoering acties
	7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte	7.6 Herinrichting openbare ruimte Dreef, inclusief Molenstraat	Evaluatie en nazorg
		7.7 Herinrichting Kerkplein	Evaluatie en nazorg
		7.8 Riolvervanging en herinrichting Nieuwstraat en deel Poststraat (in samenhang met 7.7)	Uitvoering
		7.9 Relinen riolering Lange Ring	Evaluatie en nazorg
	8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid	8.5 Herinrichting Deestraat	Planvoorbereiding (implementatie uitkomsten project 7.12)
8.9 Onderzoek gebruik OV halte		Evaluatie + bepalen vervolgstap.	

Jaar	ER doel	Project	Activiteiten
2022	1. Vitaler Centrum	1.3 Herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie Nieuwstraat 12	Oplevering Evaluatie en nazorg
	2. Gedifferentieerder woningaanbod	2.6 Herstructurering woningen Deltastraat/Van Hertsbekestraat fase 2	Vorbereiding uitvoering Uitvoering
	5. Meer leefbaarheid	5.3 Uitvoeren acties Dorpsblik	Doorlopend
	6. Betere economische structuur	6.1 Bedrijventerrein fase 3	Gronduitgifte
		6.3 Branding Bruinisse	Uitvoeren acties
	7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte	7.8 Rioolvervanging en herinrichting Nieuwstraat en deel Poststraat (in samenhang met 7.1)	Uitvoering (relatie met gereed 1.2, 1.3)
	8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid	8.5 Herinrichting Deestraat	Uitvoering (relatie met 1.2 en 1.3) Evaluatie en nazorg
		8.8 Herinrichting Oudestraat	Planvoorbereiding Start uitvoering

5. Overzicht afgeronde projecten

ER-doelen	Afgeronde Projecten	Werkelijke kosten c.q. investering	Initiatiefnemer(s)
Centrale doelstelling Programma Bruinisse Voortvarend			
	Structuurvisie Bruinisse 2025	€ 15.210	Gemeente
1. Vitaler centrum			
1.1	Masterplan en Beeldkwaliteitplan Centrumgebied Bruinisse en woningmarktanalyse	€ 183.928	Gemeente
2. Gedifferentieerder woningaanbod			
2.1	Herstructurering Kon. Julianastraat e.o. Fase 1	€ 4.072.158 (incl. btw)	Zeeuwend
2.1	Herstructurering Kon. Julianastraat e.o. fase 2	€ 3.734.453 (incl. btw)	Zeeuwend
2.4	Woningbouw Molenweg	€ 37.777 (kosten) € 244.349 (positief resultaat bij afsluiten GreX)	Gemeente
3. Aantrekkelijker toeristische trekpleister			
3.1	Onthaal naar het Deltawater (Herinrichting Vissershaven en Havenplateau)	€ 2.403.034 € 538.941	Gemeente + Projectbureau Zeeweringen
3.2	Vestiging viswinkel en restaurant Bru 17 op Havenplateau	€ p.m.	Habrakennis
3.3	Realisatie fietspad langs Vluchthaven en Stoopolder	€ p.m.	Projectbureau Zeeweringen
3.4	Verplaatsing cafetaria en uitbreiding met lunchroom Korte Ring	€ p.m.	Johnny's Taria v.o.f.
3.5	Hotel Bru Oudestraat	€ p.m.	Hoep Beheer B.V.

3.6	Verlengen wandelpad over Noorddijk/Havendijk	Onderdeel kosten project 8.3	Gemeente
3.7	Wandelroute Bru Verbeeld, fase 1	€ p.m.	Stichting Brusea
4. Betere sportvoorzieningen			
4.1	Verplaatsing sportvelden	€ 1.803.234	Gemeente
4.2	Nieuwbouw clubgebouw Bruse Boys	€ 742.500 (waarvan € 395.850 gemeente)	Bruse Boys
4.3	Skatebaan	€ 12.000	Dorpsraad
5. Meer Leefbaarheid			
5.1	Dorpsvisie Dorpsblik Bruinisse	€ 17.500	Dorpsraad
6. Betere economische structuur			
6.3.	Branding Bruinisse, visie	€ 13.475 (onderdeel kosten Masterplan)	Gemeente
6.5	Aanleg mantelbuizen noordelijk deel Vluchthaven	€ p.m.	Projectbureau Zeeweringen
6.4	Onderzoek uitbreiding bedrijventerrein	€ p.m.	Gemeente
7. Betere beeldkwaliteit openbare ruimte			
7.1	Inrichtingsplan openbare ruimte centrumgebied (2011), inclusief verkeerscirculatie-onderzoek.	€ 28.437	Gemeente
7.2	Herinrichting openbare ruimte Koningin Julianastraat/Prinses Beatrixstraat, fase 1	Onderdeel totale kosten fase 1 project 2.1	Zeeuwsland
7.4	Plaatsen afvalvoorzieningen	€ 3.000	Gemeente
7.5	Pimp-de-panden	€ p.m.	Dorpsraad
7.10	Opknappen viaduct De Meestove	€ 6.000	Gemeente € 1.500 Aannemer De Bokx € 4.500

7.11	Aangepast inrichtingsplan openbare ruimte, inclusief aangepast verkeerscirculatieplan	€ 100.000	Gemeente
8. Optimalere verkeerscirculatie/betere bereikbaarheid			
8.1	Verbreiding Groeneweg/Hageweg en aanpassing kruispunt met Jachthavenweg en Noorddijk	€ 404.000	Gemeente
8.4	Aanpassing kruising Industrieweg + riolering	€ 264.000	Gemeente
8.5	Uitbreiden fietsenstalling Deltastraat	€ 5.769	Gemeente
8.2	Herinrichting Noorddijk/Havendijk + Vervanging riolering	€ 206.976, waarvan € 42.000 BDU subsidie € 279.502	Gemeente
8.7	Invoering eenrichting verkeer Noorddijk deel Deltastraat/Bergstraat	€ p.m.	Gemeente
